ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY STAVBA OBEC VYSOČANY - ČOV A STOKOVÁ SÍŤ

ID	Stoka	Část obce	Materiál	DN	Délka [m]	Zahájení	Dokončení
1	A	Housko	PP	DN 300	877,7	21.10. 13	18.9. 14
2	AA	Housko	PP	DN 250	43	1.10. 14	9.11. 14
3	AB	Housko	PP	DN 250	133,7	21.7. 14	14.9. 14
4	AB-1	Housko	PP	DN 250	120	14.7. 14	28.9. 14
5	AC	Housko	PP	DN 250	345,8	1.9. 14	7.12. 14
6	AD	Housko	PP	DN 300	550,4	24.2. 14	1.10. 14
7	AD-1	Housko	PP	DN 250	57	4.8. 14	7.9. 14
8	AD-2	Housko	PP	DN 250	57	8.9. 14	12.10. 14
9	AE	Housko	PP	DN 250	223,4	27.1. 14	9.3. 14
10	ČS v6 - přepad	Housko	PP	DN 300	24	8.9. 14	12.10. 14
11	výtlak V1	Housko	PE 100-RC	De 63	98	1.9. 14	12.10. 14
12	výtlak V2	Housko	PE 100-RC	De 63	60,5	15.9. 14	26.10. 14
13	výtlak V3	Housko	PE 100-RC	De 63	118,8	22.9. 14	2.11. 14
14	výtlak V3-1	Housko	PE 100-RC	De 63	16,5	29.9. 14	9.11. 14
15	výtlak V4	Housko	PE 100-RC	De 63	24,5	14.4. 14	27.4. 14
16	výtlak V5	Housko	PE 100-RC	De 63	122,4	29.9. 14	26.10. 14
17	výtlak V6	Housko	PE 100-RC	De 110	283,7	6.10. 14	30.11. 14
18	výtlak V6-1	Housko	PE 100-RC	De 63	36	27.10. 14	7.12. 14
19	domovní kan. přípoj	Housko	PP	DN 150	0	31.3. 14	14.12. 14
20	zapravení komunik	Housko			0	8.9. 14	3.5. 15
21	B	Molenburk	PP	DN 300	422	7.4. 14	17.8. 14
22	BA	Molenburk	PP	DN 250	115	12.5. 14	15.6. 14
23	BB	Molenburk	PP	DN 250	35	5.5. 14	11.5. 14
24	BC	Molenburk	PP	DN 250	25	5.5. 14	11.5. 14
25	BD	Molenburk	PP	DN 250	60	9.6. 14	20.6. 14
26	BE	Molenburk	PP	DN 250	144,5	12.5. 14	25.5. 14
27	BF	Molenburk	PP	DN 250	51	2.6. 14	9.6. 14
28	C	Molenburk	PP	DN 250	40	7.7. 14	28.7. 14
29	D	Molenburk	PP	DN 250	60	12.5. 14	25.5. 14
30	E	Molenburk	PP	DN 250	43	5.5. 14	18.5. 14
31	EA	Molenburk	PP	DN 250	63	19.5. 14	1.6. 14
32	F	Molenburk	PP	DN 250	115	28.4. 14	11.5. 14
33	H	Molenburk	PP	DN 250	20	12.5. 14	25.5. 14
34	I	Molenburk	PP	DN 250	202	5.5. 14	18.5. 14
35	J	Molenburk	PP	DN 250	28,5	23.6. 14	13.7. 14
36	L	Molenburk	PP	DN 250	173,5	7.4. 14	27.4. 14
37	LA	Molenburk	PP	DN 250	167	17.3. 14	27.4. 14
38	M	Molenburk	PP	DN 250	86	18.8. 14	29.8. 14
39	N	Molenburk	PP	DN 250	46,5	7.7. 14	25.7. 14
40	O	Molenburk	PP	DN 250	58,5	16.6. 14	22.6. 14
41	P	Molenburk	PP	DN 250	48,5	23.6. 14	29.6. 14
42	Q	Molenburk	PP	DN 250	228	3.3. 14	6.4. 14
43	výtlak VA	Molenburk	PE 100-RC	De 160	930,9	23.6. 14	12.12. 14
44	výtlak VA	Molenburk	PE 100-RC	De 125	163,1	1.9. 14	21.9. 14
45	výtlak VA 1	Molenburk	PE 100-RC	De 90	13	1.9. 14	21.9. 14
46	výtlak VA 2	Molenburk	PE 100-RC	De 63	1	1.9. 14	21.9. 14
47	výtlak VA 3	Molenburk	PE 100-RC	De 90	444	14.7. 14	22.2. 15
48	výtlak VA 3-1	Molenburk	PE 100-RC	De 90	2	18.8. 14	14.9. 14
49	výtlak VA 3-2	Molenburk	PE 100-RC	De 90	11	18.8. 14	14.9. 14
50	výtlak VA 3-3	Molenburk	PE 100-RC	De 90	16	18.8. 14	14.9. 14
51	výtlak VA 4	Molenburk	PE 100-RC	De 90	27	18.8. 14	14.9. 14
52	výtlak VA 5	Molenburk	PE 100-RC	De 90	47,5	25.8. 14	21.9. 14
53	výtlak VA 6	Molenburk	PE 100-RC	De 63	38	15.9. 14	5.10. 14
54	výtlak VA 7	Molenburk	PE 100-RC	De 90	15	1.9. 14	21.9. 14
55	výtlak VA 8	Molenburk	PE 100-RC	De 90	9,5	1.9. 14	21.9. 14
56	výtlak VA 9	Molenburk	PE 100-RC	De 63	20,5	8.9. 14	28.9. 14
57	výtlak VA 11	Molenburk	PE 100-RC	De 63	27	8.9. 14	28.9. 14
58	výtlak VA 13	Molenburk	PE 100-RC	De 63	20	15.9. 14	5.10. 14
59	výtlak VA 14	Molenburk	PE 100-RC	De 90	32,5	15.9. 14	5.10. 14
60	výtlak VA 15	Molenburk	PE 100-RC	De 90	35	15.9. 14	5.10. 14
61	výtlak VA 16	Molenburk	PE 100-RC	De 125	27,5	22.9. 14	12.10. 14
62	výtlak VA 16-1	Molenburk	PE 100-RC	De 90	16,5	22.9. 14	26.10. 14
63	výtlak VA 17	Molenburk	PE 100-RC	De 63	121,6	22.9. 14	26.10. 14
64	výtlak VA 17	Molenburk	PE 100-RC	De 125	87,9	22.9. 14	26.10. 14
65	výtlak VA 17-1	Molenburk	PE 100-RC	De 90	9	22.9. 14	12.10. 14
66	výtlak VA 17-2	Molenburk	PE 100-RC	De 90	85,5	6.10. 14	2.11. 14
67	výtlak VA 17-2-1	Molenburk	PE 100-RC	De 63	126,4	13.10. 14	9.11. 14
68	výtlak VA 17-2-1	Molenburk	PE 100-RC	De 90	4,6	13.10. 14	9.11. 14
69	výtlak VA 17-3	Molenburk	PE 100-RC	De 125	37,5	13.10. 14	9.11. 14
70	výtlak VA 18	Molenburk	PE 100-RC	De 63	6	27.10. 14	30.11. 14
71	výtlak VA 19	Molenburk	PE 100-RC	De 90	6,5	27.10. 14	30.11. 14
72	výtlak VA 20	Molenburk	PE 100-RC	De 90	18	27.10. 14	7.12. 14
73	výtlak VA 21	Molenburk	PE 100-RC	De 63	4,5	27.10. 14	30.11. 14
74	výtlak VA 22	Molenburk	PE 100-RC	De 63	3	27.10. 14	30.11. 14
75	výtlak VA 23	Molenburk	PE 100-RC	De 125	49	20.10. 14	9.11. 14
76	výtlak VA 24	Molenburk	PE 100-RC	De 63	2,5	20.10. 14	9.11. 14
77	výtlak VA 25	Molenburk	PE 100-RC	De 63	70,5	4.8. 14	19.10. 14
78	výtlak VA 25	Molenburk	PE 100-RC	De 90	123,5	4.8. 14	19.10. 14
79	výtlak VA 25-1	Molenburk	PE 100-RC	De 63	24	18.8. 14	21.9. 14
80	výtlak VA 25-2	Molenburk	PE 100-RC	De 63	11	18.8. 14	14.9. 14
81	výtlak VA 25-3	Molenburk	PE 100-RC	De 90	7	18.8. 14	7.9. 14
82	výtlak VA 25-4	Molenburk	PE 100-RC	De 63	9	18.8. 14	7.9. 14
83	výtlak VA 25-5	Molenburk	PE 100-RC	De 63	6,5	18.8. 14	7.9. 14
84	výtlak VA 25-6	Molenburk	PE 100-RC	De 63	6	25.8. 14	21.9. 14
85	výtlak VA 26	Molenburk	PE 100-RC	De 63	60,6	25.8. 14	14.9. 14
86	výtlak VA 26	Molenburk	PE 100-RC	De 90	65,4	25.8. 14	14.9. 14
87	výtlak VA 26-1	Molenburk	PE 100-RC	De 90	11	1.9. 14	28.9. 14
88	výtlak VA 26-2	Molenburk	PE 100-RC	De 63	5,5	1.9. 14	28.9. 14
89	výtlak VA 26-3	Molenburk	PE 100-RC	De 63	25,5	1.9. 14	28.9. 14
90	výtlak VA 27	Molenburk	PE 100-RC	De 125	9	1.9. 14	28.9. 14
91	výtlak VA 28	Molenburk	PE 100-RC	De 63	23,5	15.9. 14	12.10. 14
92	výtlak VA 29	Molenburk	PE 100-RC	De 63	8	15.9. 14	12.10. 14
93	výtlak VA 29-1	Molenburk	PE 100-RC	De 63	40,5	15.9. 14	12.10. 14
94	výtlak VA 30	Molenburk	PE 100-RC	De 63	88,6	8.9. 14	19.10. 14
95	výtlak VA 30	Molenburk	PE 100-RC	De 90	40,9	8.9. 14	19.10. 14
96	výtlak VA 30-1	Molenburk	PE 100-RC	De 63	3	8.9. 14	5.10. 14
97	výtlak VA 30-2	Molenburk	PE 100-RC	De 63	6	8.9. 14	5.10. 14
98	výtlak VA 30-3	Molenburk	PE 100-RC	De 63	3,5	15.9. 14	12.10. 14
99	výtlak VA 30-4	Molenburk	PE 100-RC	De 63	4,5	15.9. 14	12.10. 14
100	výtlak VB	Molenburk	PE 100-RC	De 63	422	7.7. 14	19.9. 14
101	výtlak VB-1	Molenburk	PE 100-RC	De 110	194	8.9. 14	22.2. 15
102	výtlak VC	Molenburk	PE 100-RC	De 63	96	13.10. 14	9.11. 14
103	výtlak VC-1	Molenburk	PE 100-RC	De 63	17	13.10. 14	9.11. 14
104	výtlak VD 1	Molenburk	PE 100-RC	De 63	4	15.9. 14	12.10. 14
105	výtlak VD 2	Molenburk	PE 100-RC	De 63	5,5	15.9. 14	12.10. 14
106	výtlak VE	Molenburk	PE 100-RC	De 63	139	22.9. 14	15.2. 15
107	domovní kan. přípoj	Molenburk	PP	DN 150	0	31.3. 14	14.12. 14
108	zapravení komunik	Molenburk			0	8.9. 14	3.5. 15

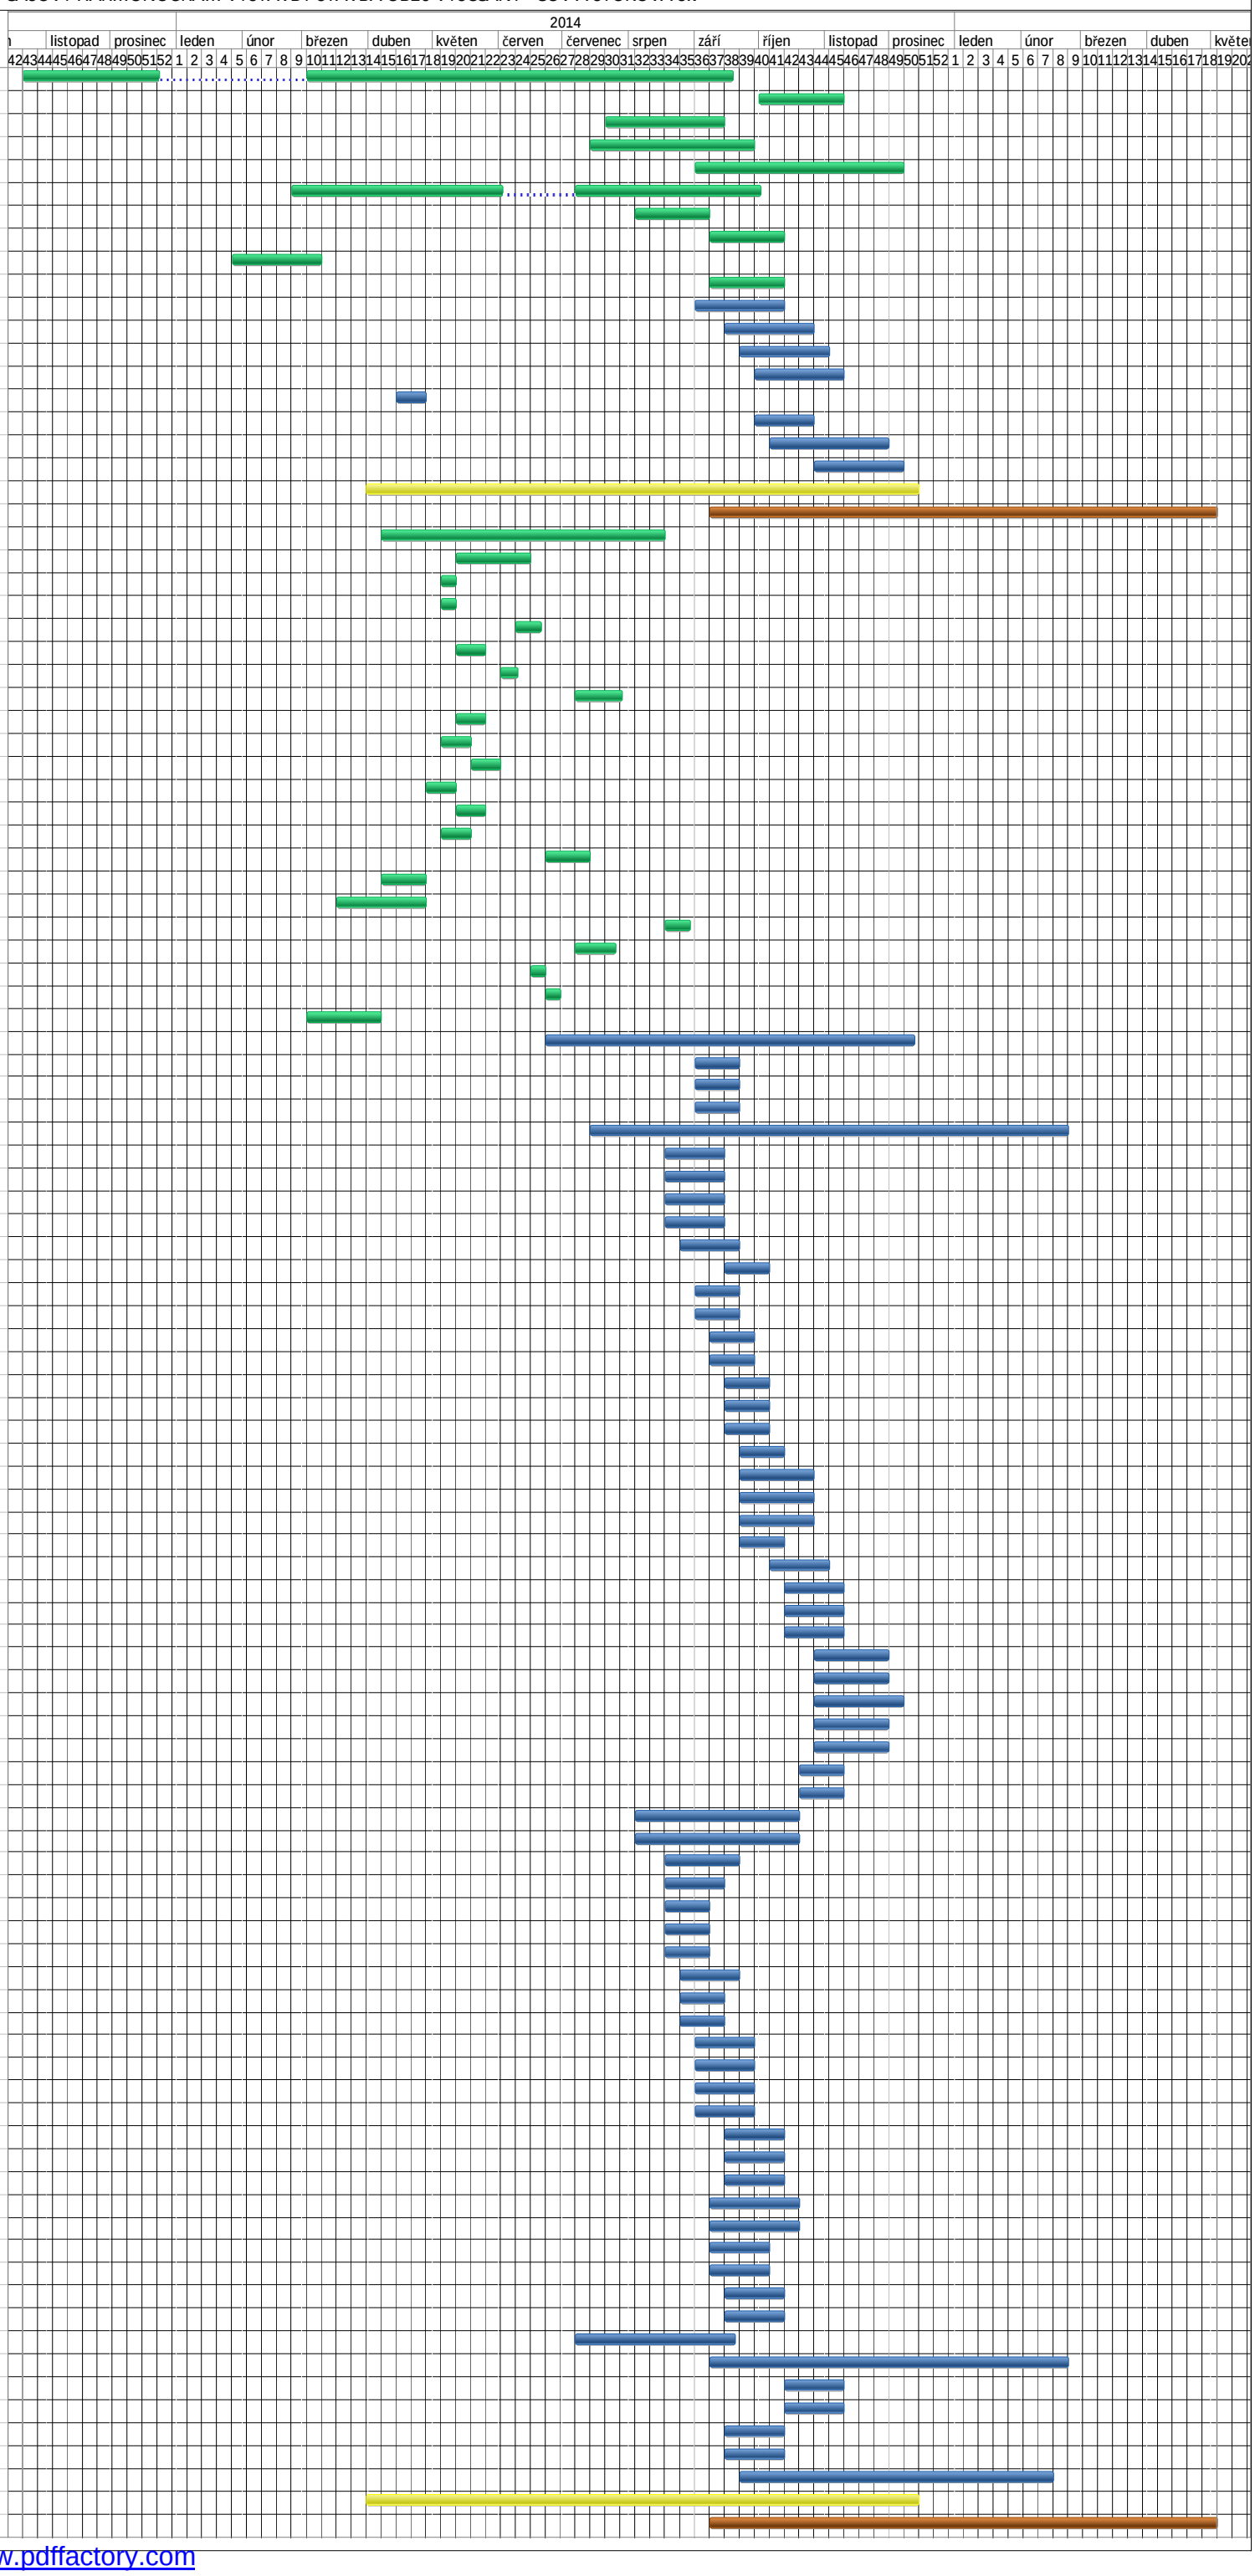

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com
